

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक प्रगति विवरण

भौतिक पुर्वाधार समिति(प्राविधिक
शाखा,)

फिदिम नगरपालीकाको कार्यालय,
पाँचथर

२०७८ श्रावण १४




आ.व. २०७७-०७८ मा संपन्न गरिएका योजनाहरुको संख्यात्मक विवरण

- आ.व. २०७७/०७८ मा सम्पन्न योजनाहरुको संक्षिप्त विवरण

निकाय	योजना संख्या	संभौता सम्पन्न	सम्पन्न संख्या	प्रगति प्रतिशत
Muni	141	136	136	96.45
W1	16	15	15	93.75
W2	28	24	24	85.71
W3	16	15	15	93.75
W4	13	12	12	92.31
W5	30	29	29	96.67
W6	26	22	22	84.62
W7	26	26	26	100.00
W8	12	11	11	91.67
W9	12	11	11	91.67
W10	22	22	22	100.00
W11	21	21	21	100.00
W12	12	12	12	100.00
W13	10	10	10	100.00
W14	17	16	16	94.12
Total	402	382	382	94.71

● क्रमश :

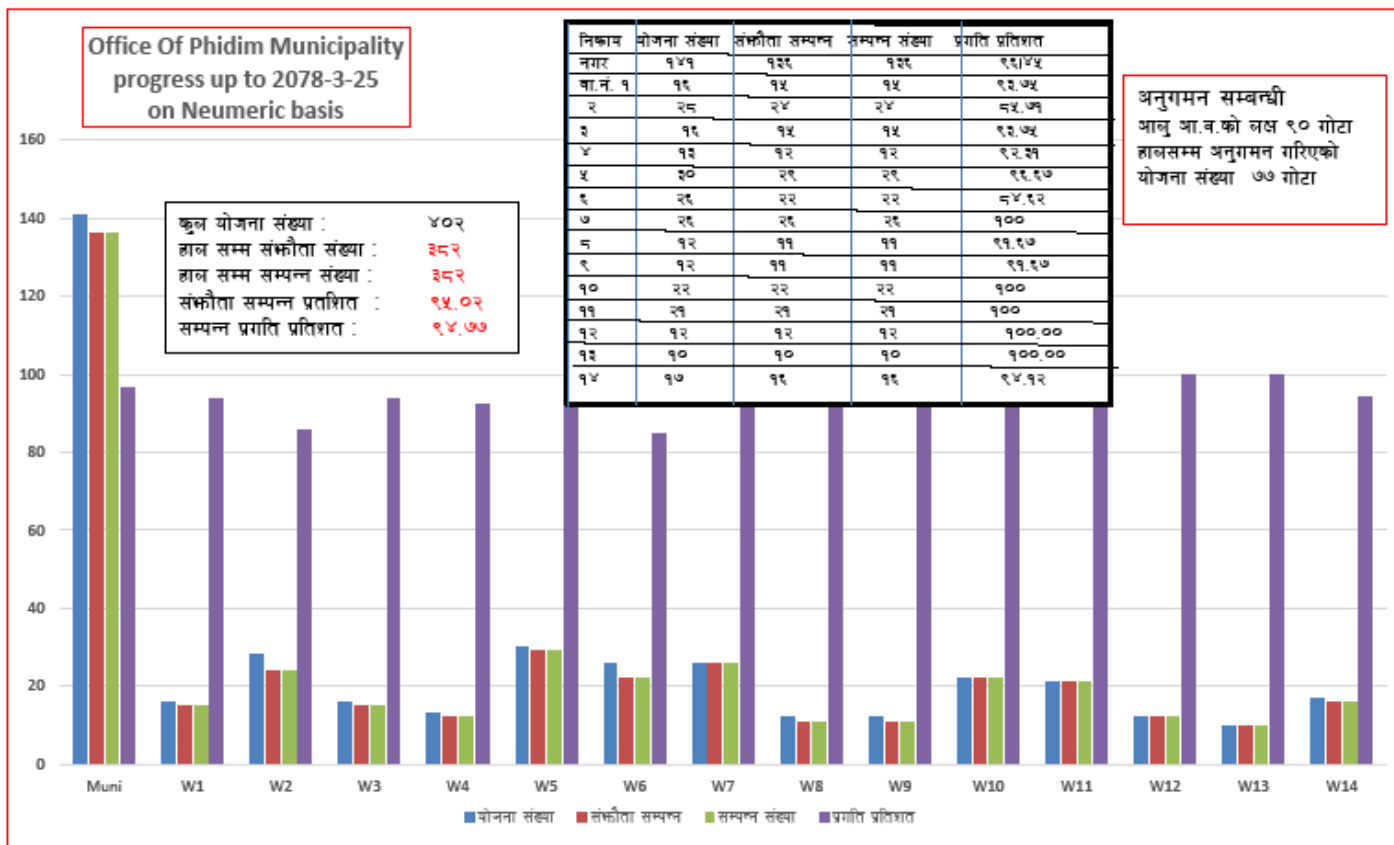

तयारी गर्ने प्रेम काफ्ले

आ.व. २०७६-०७७ को भौतिक प्रगति

- निमाण तर्फ

क्र.सं	कार्याक्रमको नाम	क्रियाकलापहरु	इकाई	लक्ष	प्रगति		कैफियत
				परिमाण	परिमाण	प्रतिशत	
	निर्माण तर्फ						
1	सडक						
		ट्रयाक खोल्ने काम	कि.मि.	५७८६	५७८६	१००	
		सडक मर्मत संभार	कि.मि.	२००	१९३८४	९६९२	
		सडक स्तरोन्नती	कि.मि.	३५	३२६०	९३१४	
		सडक सतह सोलीड	कि.मि.	३	२६९६	८७२	
		सडक सतह ग्राभेल	कि.मि.	१	०१४३८	४३८	
		सडक पक्की नाली निर्माण	कि.मि.	२११	२१००८	९५१६२	
		खोला/खोल्सी कज्वे निर्माण	गोटा	७	६	८५१७१	
		एच डि.पि. पाई क्रसीड	गोटा	१६	१५	९३१७५	
		आर सि सि ह्युम पाईप क्रसीड	गोटा	३	३	१००	
		स्लाब कर्भट निर्माण	गोटा	१	१	१००	
2	पुल निर्माण						

• क्रमश :

क्र.सं	कार्याक्रमको नाम	क्रियाकलापहरु	इकाई	लक्ष	प्रगति		कैफियत
				परिमाण	परिमाण	प्रतिशत	
5	सिडी मार्ग						
		सिडी मार्ग निर्माण	मि.	१०००	८८८	८८.८	
		सिडी मार्ग तथा रेलिड निर्माण	मि.	२४०	२४०	१००	
6	खानेपानी						
		खानेपानी निर्माण	गोटा	०	०	०	
		खानेपानी मर्मत संभार	गोटा	२०	२०	१००	
7	सिंचाई						
		सिंचाई कुलो निर्माण	गोटा	२	२	१००	
		सिंचाई कुलो मर्मत संभार	गोटा	२१	२०।५	९७.६२	
8	खेल मैदान						
		खेल मैदान निर्माण	गोटा	१०	१०	१००	
		खेल मैदान मर्मत संभार	गोटा	३	३	१००	
9	मठ मंदीर						
		मठमन्दीर निर्माण	गोटा	१८	१८	१००	
		मठमन्दीर मर्मत संभार	गोटा	१०	१०	१००	
10	गोरेटो बाटो						
		गोरेटो बाटा निर्माण	कि.मि.	२।२५	२।२५	१००	

• क्रमश

क्र.सं	कार्याक्रमको नाम	क्रियाकलापहरु	इकाई	लक्ष	प्रगति		कैफियत
				परिमाण	परिमाण	प्रतिशत	
	खरीद तर्फ						
1	जस्तापा	जस्तापाता खरिद	बण्डल	४०१।५	४०१।५	१००	
2	पोलीथिन पाई						
		खानेपानी ग्रयोजनको लागी	कि.मि.	१३।०४४	१३।०४४	१००	
		सिंचाई प्रयोजनाको लागी	कि.मि.	१२।८६५	१२।८६५	१००	
3	तयारी ग्याविन तारजाली						
		तयारी ग्याविनतारजाली खरिद सडक तथा विपद व्यवस्थापनको लागी	गोटा	३३२	३३२	१००	
4	प्रयोगशाला व्यवस्थापन						
		प्रयोगशालाको लागी औजार उपकरण तथा अन्य सामग्री खरीद	सेट	१	१	१००	
5	विद्युतीकरण						
		फिदिम १ ठाडो लाईनमा ब्यक्त अबदाभि जडान	कि.मि.	०।५४	०।५४	१००	
6	घर नक्शा सम्बन्धी						
		पुराना घर अभिलेखीकरण	गोटा	१००	७०	७०	
		नया घरको नक्शा स्वीकृत	गोटा	२५	१०	४०	

सडक बोर्ड तर्फ

सि.नं.	कृत्याकलापहरु	ईकाइ	लक्ष	प्रगति परिमाण	प्रगति प्रतिशत
1	सडक स्तरोन्नती	किमि	33.00	32.60	98.79
2	कज्वे निर्माण	गोटा	2.00	2.00	100.00
3	सडक सतह सोलिड	किमि	1.40	1.31	93.43
4	मेशोनरी टेवा पर्खाल निर्माण	मि.	430.00	403.00	93.72
5	ग्याविन टेवा पर्खाल निर्माण	घ.मी.	1000.00	973.00	97.30
6	एच.डि.पि. पाईप क्रीड	गोटा	7.00	7.00	100.00
7	पक्की ड्रेन निर्माण	कि.मि.	360.00	358.00	99.44
8	सडक सतह ग्राभेल	कि.मि.	0.44	0.44	99.55

शहरी साशकीय सुधार तर्फ

सि.नं.	योजनाको सारांस	ईकाई	लक्ष्य	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत
1	जम्मा स्वीकृत योजना	गोटा	31	30	96.7742
2	शौचालय निर्माण	गोटा	5	5	100
3	कज्वे निर्माण	गोटा	4	4	100
4	सडक सतह सोलीड	कि.मि.	0.663	0.663	100
5	पक्की नाली निर्माण	कि.मि.	0.207	0.207	100
6	सिंचाई कुो मर्मत	गोटा	1	1	100
7	काठेपुल निर्माण	गोटा	2	1	50
8	विद्यालय भवन निर्माण	गोटा	1	1	100
9	विद्यालय भवन मर्मत	गोटा	3	3	100
10	सिडि निर्माण	मि.	125	125	100
11	पार्क निर्माण	गोटा	1	1	100
12	खा.पा. टेंकी निर्माण	गोटा	1	1	100
13	विद्यालय घेरावा	गोटा	2	2	100

योजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू

- योजना संख्याको तलनामा जनशक्तीको अपर्याप्ता
- नियमित योजना भन्दा थप योजना संख्या बढी
- यातायात साधनको अप्रयाप्तता
- कोरोना सङ्क्रमणको प्रभाव
- आम उपभोक्ता तथा नागरिक समाजमा विकास निर्माणको कार्यमा कम चासो
- निर्माण उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूमा सेवाको भावनामा कमी
- निर्माण उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीमा निर्माण कार्य र खरिद प्रकृत्यामा ज्ञानको कमी
- समिति निर्माणमा समस्या

क्रमश :

- प्राविधिक कर्मचारीहरुमा समय अनुसार नयाँ नयाँ प्रविधिहरु सम्बन्धी तालीमको अभाव
- निर्णय कार्यान्वयनमा नैरास्यता ?
- उपभोक्ताहरुमा बढी महत्वकान्छा ।
- मुर्ति निर्माण / खरिद तथा स्थापनमा स्पष्ट नर्म नभएको
- लगत अनुमान स्वीकृत विना संभौता गरेका (वडा स्तरमा)
- समयमा कार्य सुचारु नगर्ने

समाधानका उपायाहरू (हुनसक्छ)

- गरिएका / भएका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा ध्यान दिन' पर्ने ।
- यातायातको साधनहरूको व्यवस्थापनमा ध्यान दिने
- उपभोक्ताका पदाधिकारीहरूलाई योजना संचालन सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालीम / गोष्ठीको व्यवस्था गर्ने
- कर्मचारीहरूलाई आफ्नो कर्तव्य प्रति समय समयमा सजग गराई काम चुस्त दुरुस्त गर्न गराउन उत्प्रेरित गर्ने र दण्डहिनताको अन्त्य गर्ने ।
- पारित गरिएको वार्षिक खरिद योजना जस्ताको तस्तै लाग' गर्ने

क्रमश

- दोश्रो चौमासिकको पहिलो महीनामै संभौता गरिसक्न पर्ने
- सुपरभिजन र अनुगमन प्रणाली लाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने
- आन्तरिक अनुगमन मात्र नभई बाहारी अनुगमन समेत गर्ने गराउने व्यवस्था भए राम्रो ।

- धन्यवाद

केही तस्वीरहरु





- पाथीभरा मंदीर फि.न.पा. १०





- तृतीया -याङनाम सडक





योजना संभौता र सम्पन्नको स्थिति

